

現在の施工状況



狸平トンネル
ためきだいら通信

5月号



日頃から狸平トンネル事業にご理解とご協力をいただき厚く御礼申し上げます。

現在トンネル工事は、地下排水工が完了し、覆工コンクリートも残すところ40mとなっております。5月中旬には覆工コンクリート打設が終わり、セントル(移動式型枠)解体を5月下旬に行い、坑内の本工事は終了します。その後は、坑内の不陸整正及び片付けを行った後、仮設照明を撤去して終了します。この工事には、舗装工事や照明設備等の工事が入っていませんので、トンネルの開通はまだまだ先になります。

両坑口上の落石緩衝工は、起点側は終了しました。終点側も5月中には終了する予定です。

先月もお知らせしましたが、ゴールデンウィーク休暇は、4/26～5/7までとして、毎日現場パトロールを行い異常のないことを確認します。

今後も引き続き、安全に留意しながら工事を進めて参りますので、何卒ご協力をよろしくお願い申し上げます。

坑門上の落石緩衝工(三層構造)

1層目



EPS工

2層目



30cmの厚さのコンクリート床版

3層目



敷砂工



50cmの厚さの発泡スチロール




D25mmの鉄筋が2段で入っている



50cmの厚さのクッション砂

今後も引き続き”安全第一”で工事を進めてまいります！！

工事進捗状況

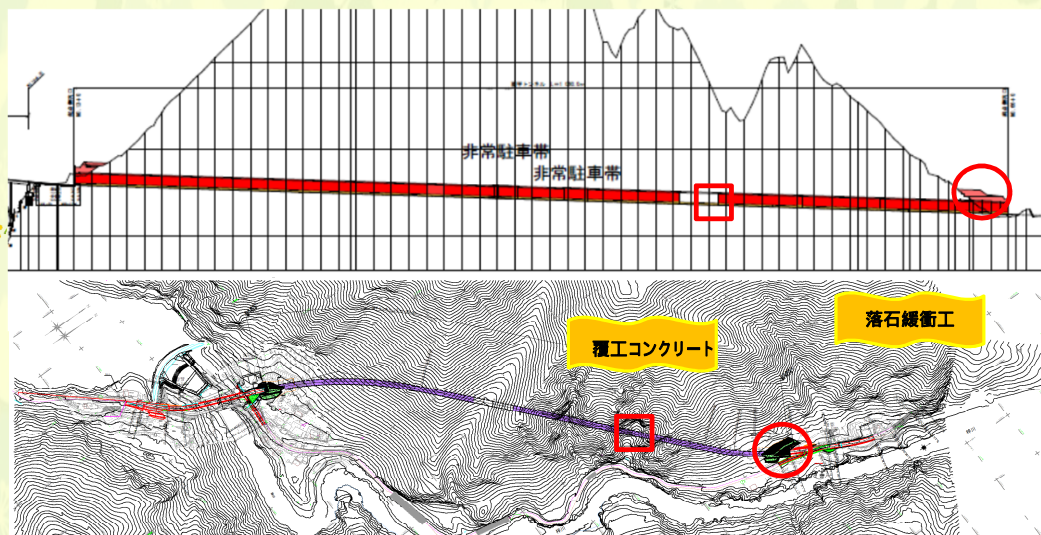

発注者 長野県 松本建設事務所 整備課 整備第三係
松本市大字島立1020
TEL 0263-40-1969(直通)



施工業者 鹿島・守谷・北信特定建設工事共同企業体
松本市安曇154
TEL 0263-88-6422

次号は、6月頃に発行予定です
