



(仮称) 狸平トンネル

ためきだいら通信



現在の施工状況

日頃から(仮称)狸平トンネル事業にご理解とご協力をいただき厚く御礼申し上げます。

トンネル掘削は、7/20現在で1045mまで進んでいます。終点側の坑口は国道に非常に接近しているため、防護用の架台を設置しました。貫通式は、8月の下旬を予定しています。インバートコンクリート(底版コンクリート)は全体の約6割、覆工コンクリートは全体の約半分が終了しています。

現場の夏期休業の予定は、8/10~18日となっています。毎日の点検パトロールを行います。

今後も引き続き、安全に留意しながら工事をすすめて参りますので、何卒ご協力をよろしくお願い申し上げます。



覆工コンクリート




終点側飛散防止架台

今後も引き続き「安全第一」で工事を進めてまいります！！

現場からのお知らせ

発生土受入地の水質モニタリングについて

発生土受入地周辺の水質調査を、全15か所で毎月実施しております。今回も前回に引き続き河川の水質に変化はありません。(表の値は下図⑫の河川水の水質調査結果ですが、河川へ流出する全箇所と同様の結果となっております。)

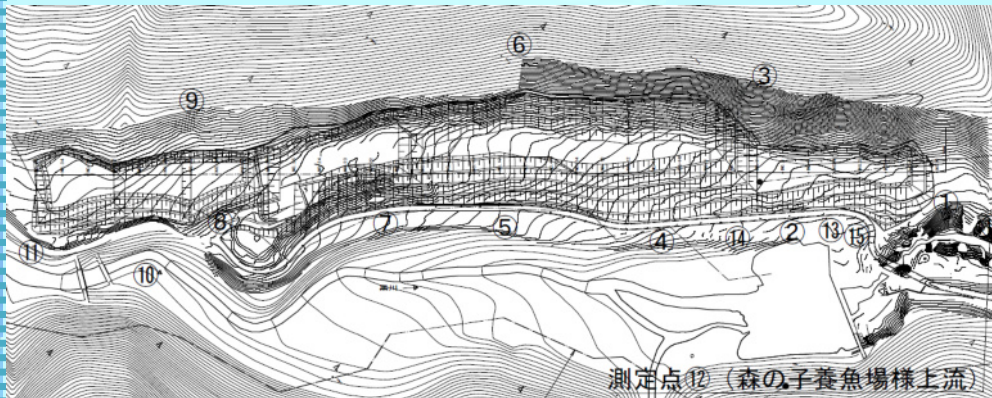

測定点⑫ (森の子養魚場様上流)

奈川地区土運搬状況  
国交省・狸平トンネル土量  
7月20日現在  
21,947m<sup>3</sup>/60,000m<sup>3</sup>  
(実績/土置場容量)

水質測定結果

項目	測定値	基準値
ひ素	0.005※ mg/L以下	0.01 mg/L以下
ふっ素	0.05※ mg/L以下	0.8 mg/L以下

※ひ素、ふっ素は測定可能限界以下となっています

測定日: 令和6年7月8日



発注者 長野県 松本建設事務所 整備課 整備第三係  
松本市大字島立1020  
TEL 0263-40-1969(直通)



施工業者 鹿島・守谷・北信特定建設工事共同企業体  
松本市安曇154  
TEL 0263-88-6422
