



狸平トンネル
ためきだいら通信

現在の施工状況

8月23日に貫通式を行いました。

日頃から狸平トンネル事業にご理解とご協力をいただき厚く御礼申し上げます。
令和4年6月7日にトンネルの安全祈願祭を行い約2年かけて1,060mを掘削しました。地質があまり良くなかったため、予定より時間がかかりましたが、地域の皆様のご協力もあり無事貫通することができました。今後も、インバートコンクリート(底版コンクリート)工、覆工コンクリート工、終点側坑門工、起終点の落石対策工等の工事がありますので、引き続き、安全に留意しながら工事を進めてまいります。ご協力をお願いいたします。



トンネルの名前が
狸平トンネルに決まったよ!



貫通



貫通式




今後も引き続き“安全第一”で工事を進めてまいります!!



現場からのお知らせ



発生土受入地の水質モニタリングについて
発生土受入地周辺の水質調査を、全15か所で毎月実施しております。今回も前回に引き続き河川の水質に変化はありません。(表の値は下図⑫の河川水の調査結果ですが、河川へ流出する全箇所と同様の結果となっております。)

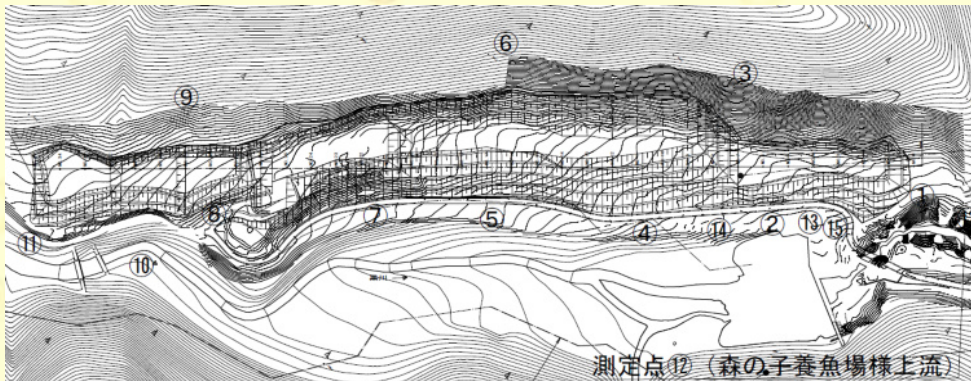

測定点⑫ (森の子養魚場様上流)

水質測定結果		
項目	測定値	基準値
ひ素	0.005※ mg/L以下	0.01 mg/L以下
ふっ素	0.05※ mg/L以下	0.8 mg/L以下

※ひ素、ふっ素は測定可能限界以下となっています
測定日: 令和6年8月5日

奈川地区土運搬状況
国交省+狸平トンネル土量
8月20日現在
22, 626m³/60,000m³
(実績/土置場容量)



発注者 長野県 松本建設事務所 整備課 整備第三係
松本市大字島立1020
TEL 0263-40-1969(直通)



施工業者 鹿島・守谷・北信特定建設工事共同企業体
松本市安曇154
TEL 0263-88-6422
