




現在の施工状況



日頃から狸平トンネル事業にご理解とご協力をいただき厚く御礼申し上げます。
現在トンネル工事は、覆工コンクリートの打設が終了し、この工事のトンネル内の本工事が終了しました。この後は、場内の不陸整正を行い、仮設電気を撤去して終了となります。
坑外の工事、終点側の落石緩衝工が終了し法面の植生マットを設置して終了となります。終点側の仮囲いは、現在のまま残します。起点側の仮囲いは6月中旬より撤去を開始して、橋梁下部工事に引き渡します。
また、トンネル銘板は7月初めに設置します。その前に、終点側の銘板の文字を書いてもらった、安曇中学の生徒さんに記念撮影をしてもらいます。
今後も引き続き、安全に留意しながら工事を進めて参りますので、何卒ご協力をよろしくお願い申し上げます。

起点側(上高地側)

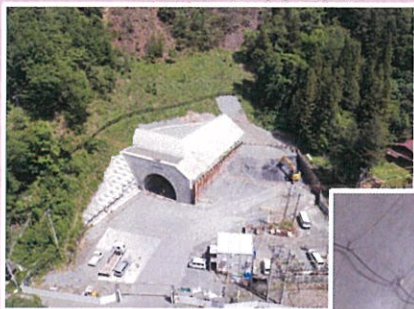

終点側(松本側)





トンネル坑内



今後も引き続き“安全第一”で工事を進めてまいります！！



工事進捗状況

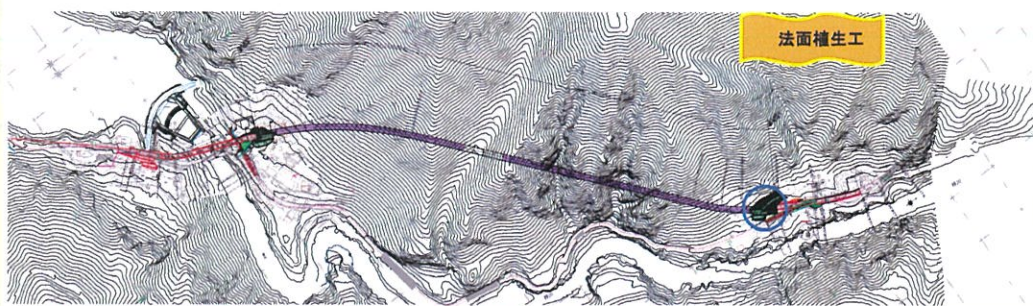

発注者 長野県 松本建設事務所 整備課 整備第三係
松本市大字島立1020
TEL 0263-40-1969(直通)



施工業者 鹿島・守谷・北信特定建設工事共同企業体
松本市安曇154
TEL 0263-88-6422



狸平トンネル
ためきだいら通信
6月号

