

現在の施工状況

奈川地区のみなさまへ

令和5年12月発行



(仮称) 狸平トンネル

ためきだいら通信



日頃から(仮称)狸平トンネル事業にご理解とご協力をいただき厚く御礼申し上げます。
 トンネル掘削は、11/20現在640m進んでおります。中間部にある非常駐車帯も2か所掘削を完了しました。坑門も型枠と足場がなくなり、トンネルの形が見えるようになりました。切羽(トンネル先端の地山)の様子ですがあまり良い状態ではありません。これからは、土被りも少なくなっていくしますので、引き続き注意して作業を行います。
 また、終点側は大きな擁壁を構築しておりトンネル掘削が進んでくる準備をしております。高さ約8mの擁壁が終わりましたら、1万m³の改良盛土を行いトンネルが安全に貫通できるようにします。観光シーズンも終わり車の数も減ってきていますが、凍結によるスリップ事故のない様に注意します。
 年末年始休業ですが、12/29~1/8まで現場を閉所いたします。
 今後も事故のない様に工事をすすめて参りますので、何卒ご協力をよろしくお願い申し上げます。



今後も引き続き”安全第一”で工事を進めてまいります！！




現場からのお知らせ



発生土受入地の水質モニタリングについて

発生土受入地周辺の水質調査を、全15か所で毎月実施しております。今回も前回に引き続き河川の水質に変化はありません。(表の値は下図の河川水の調査結果ですが、河川へ流出する全箇所と同様の結果となっております。)

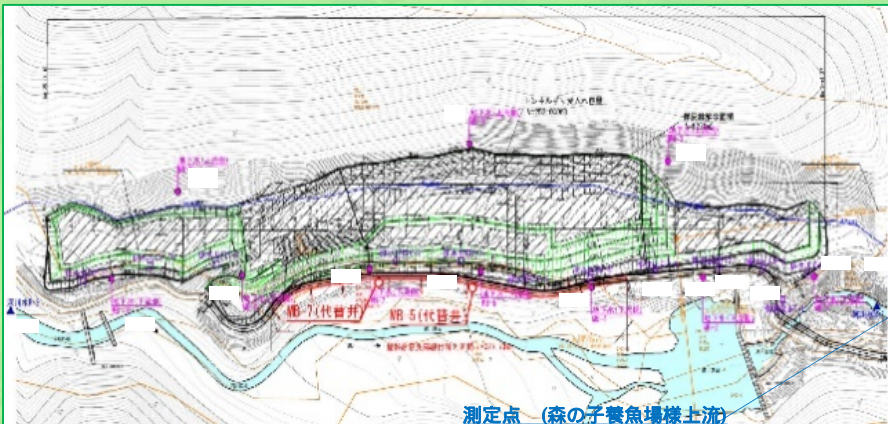

水質測定結果

項目	測定値	基準値
ひ素	0.005※ mg/L以下	0.01 mg/L以下
ふっ素	0.05※ mg/L以下	0.8 mg/L以下

※ひ素、ふっ素共測定可能限界以下となっております

測定日: 令和5年11月9日

奈川地区土運搬状況
 11月20日現在
 17,610m³/60,000m³
 (実績/土置場容量)
 国交省+狸平トンネル土量



発注者 長野県 松本建設事務所 整備課 整備第三係
 松本市大字島立1020
 TEL 0263-40-1969(直通)



施工業者 鹿島・守谷・北信特定建設工事共同企業体
 松本市安曇154
 TEL 0263-88-6422
