

経済文教委員協議会資料
8. 8. 17
教 育 委 員 会

(報告事項)

市立特別支援学校の設置に係る取組状況について

1 趣旨

市立特別支援学校の設置に係る取組状況について報告するものです。

2 経過

- 8. 3. 6 経済文教委員協議会で、長野県寿台支援学校源池分教室（以下「分教室」という。）の設置を報告
- 6. 1 9 経済文教委員協議会で、校名及び施設整備の検討状況を報告
- 7 2 3 令和8年度第4回定例教育委員会で、取組状況を報告

3 取組状況

- (1) 市立特別支援学校設置事業及び源池小学校長寿命化改良事業
別紙1のとおり
- (2) 分教室の開設
別紙2のとおり

4 今後の進め方

- (1) 施設整備は、学校等と調整を図りながら、令和9年3月末の実施設計完了に向けて事業を推進します。
- (2) 施設整備及び分教室開設に必要な経費については、適切な時期に予算措置を講じます。

市立特別支援学校設置事業及び源池小学校長寿命化改良事業 概要図

別紙1



仮設校舎賃貸借

設計期間：令和8年12月から2月まで

建設期間：令和9年3月から8月まで

賃貸借期間：令和9年9月から令和13年11月まで



長寿命化改良事業第2期工事

工期：令和11年7月から令和12年8月まで

工事概要：北校舎・体育館長寿命化改良工事

案内図



仮設校舎

軽量鉄骨造2階建て 延床面積約1,500㎡

管理棟

増築棟 職員室

南校舎

特別支援学校

プール



長寿命化改良事業第3期工事

工期：令和12年10月から令和13年11月まで

工事概要：管理棟長寿命化改良工事



プール解体工事

工期：令和9年6月から令和9年10月まで

工事概要：老朽化したプールの解体

解体後の跡地に特別支援学校を増築




長寿命化改良事業第1期工事・特別支援学校設置工事

工期：令和9年10月から令和11年1月まで


工事概要：南校舎長寿命化改良工事、特別支援学校棟新増築

計画平面図案


1階平面図

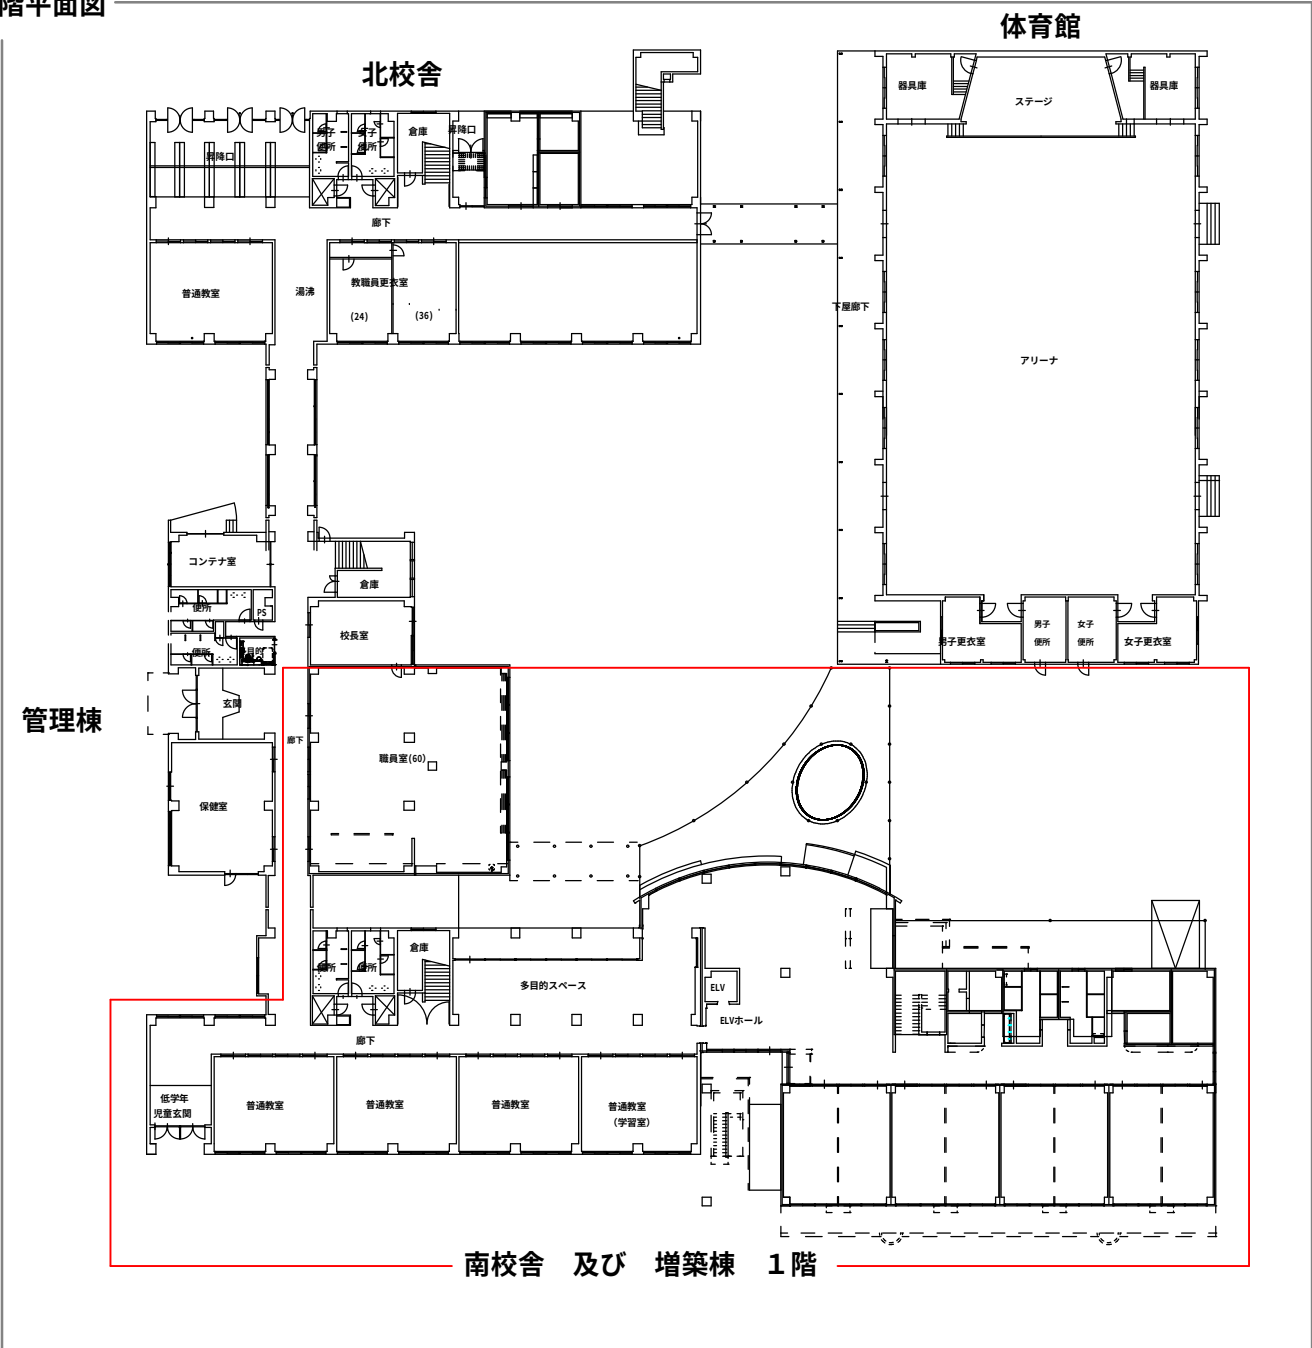


3階平面図 (北校舎)

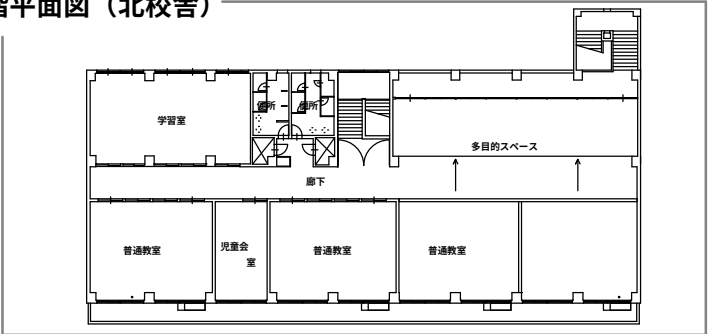

2階平面図

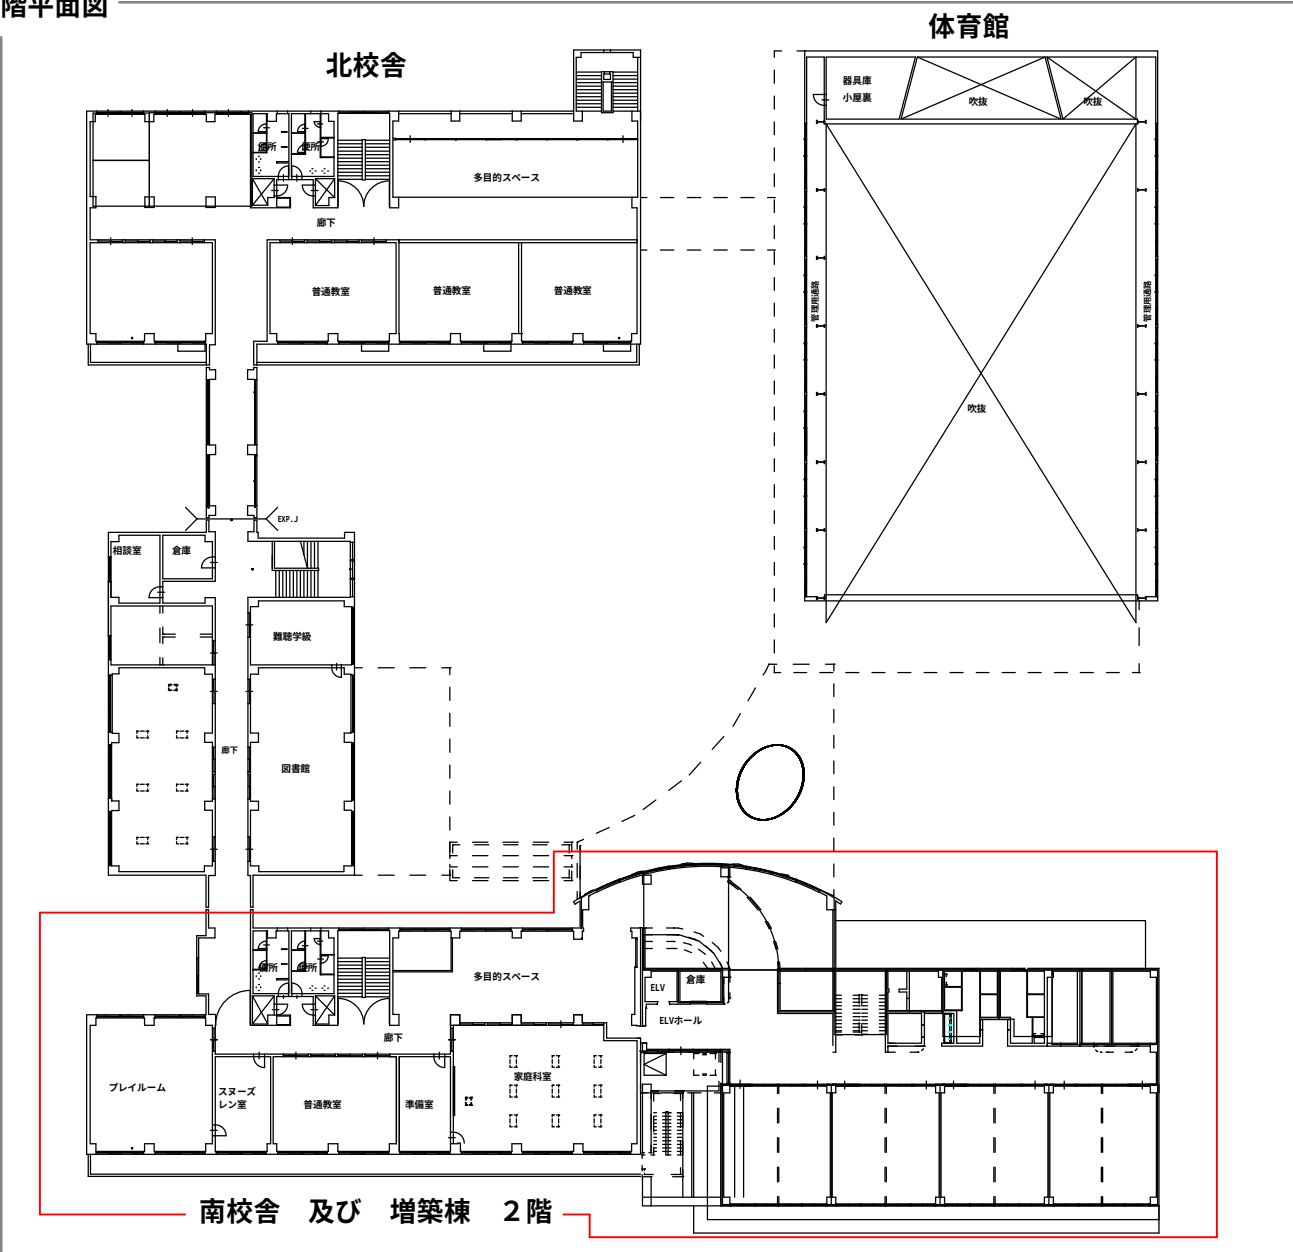

3階平面図 (南校舎)

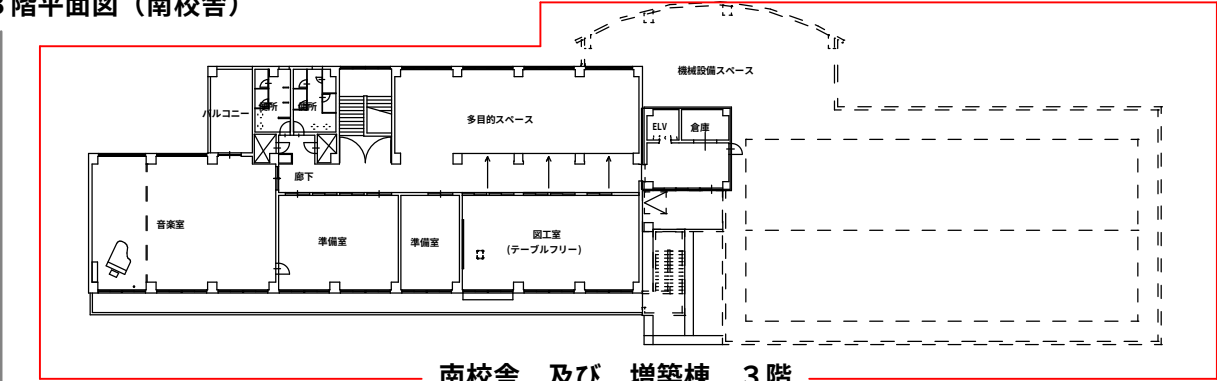

源池小学校南校舎及び(仮称)源池支援学校増築棟 1階レイアウト(案)

1 階

○職員室
(仮称)源池支援学校の職員室は、源池小の職員室を増築し、一体化します。

○中庭(イメージ図)
中庭から増築棟を望む。



体育館へ



○多目的スペース(イメージ図)
両校を結びつける開放的な空間で、交流活動、行事及び集会の開催を想定しています。

既存の耐震壁を残しつつ、接続性を確保します。



○校舎南側(イメージ図)
校舎前に広がる「源池の森」が学び及び交流の場所になります。




(仮称)源池支援学校増築棟

源池小学校南校舎及び(仮称)源池支援学校増築棟 2階レイアウト(案)

2階




ふれあいステップ
(イメージ図)
2階の交流拠点として、
ちょっとした活動ができる
場所とします。

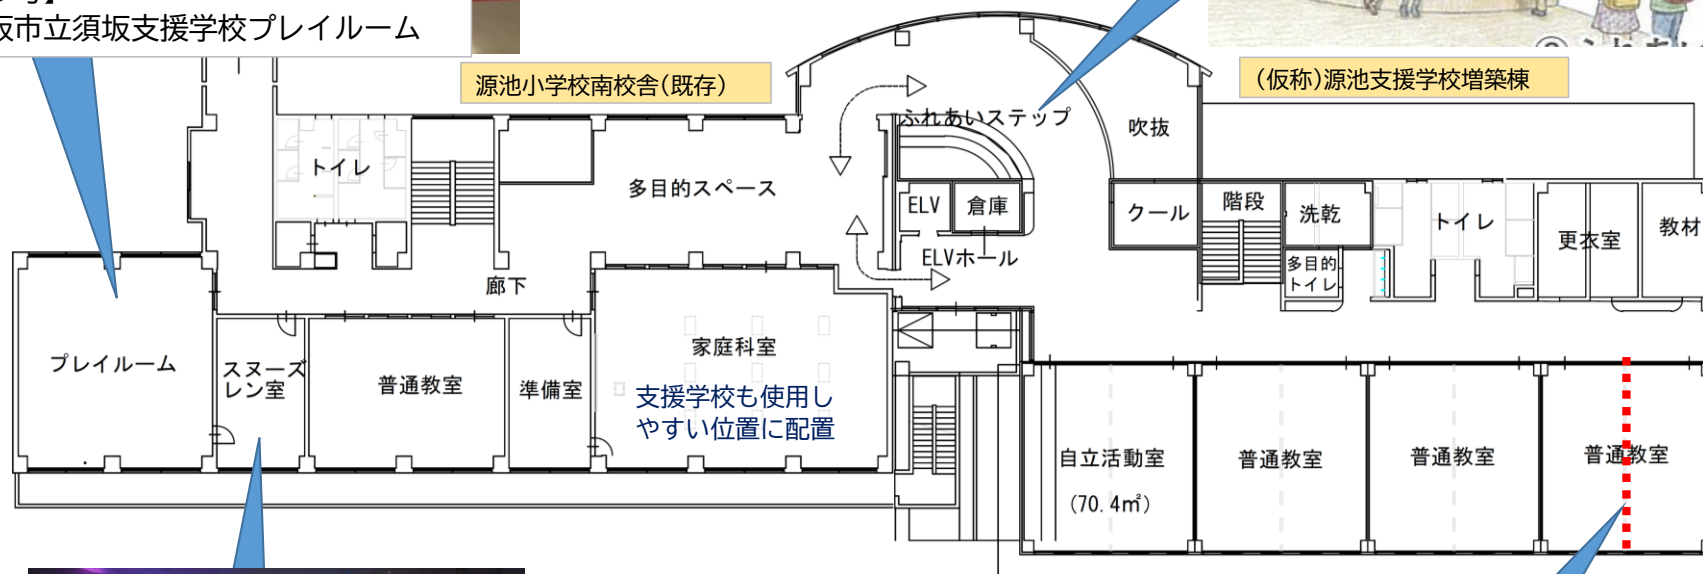

源池小学校南校舎及び(仮称)源池支援学校増築棟 3階レイアウト(案)及び事業スケジュール

3 階

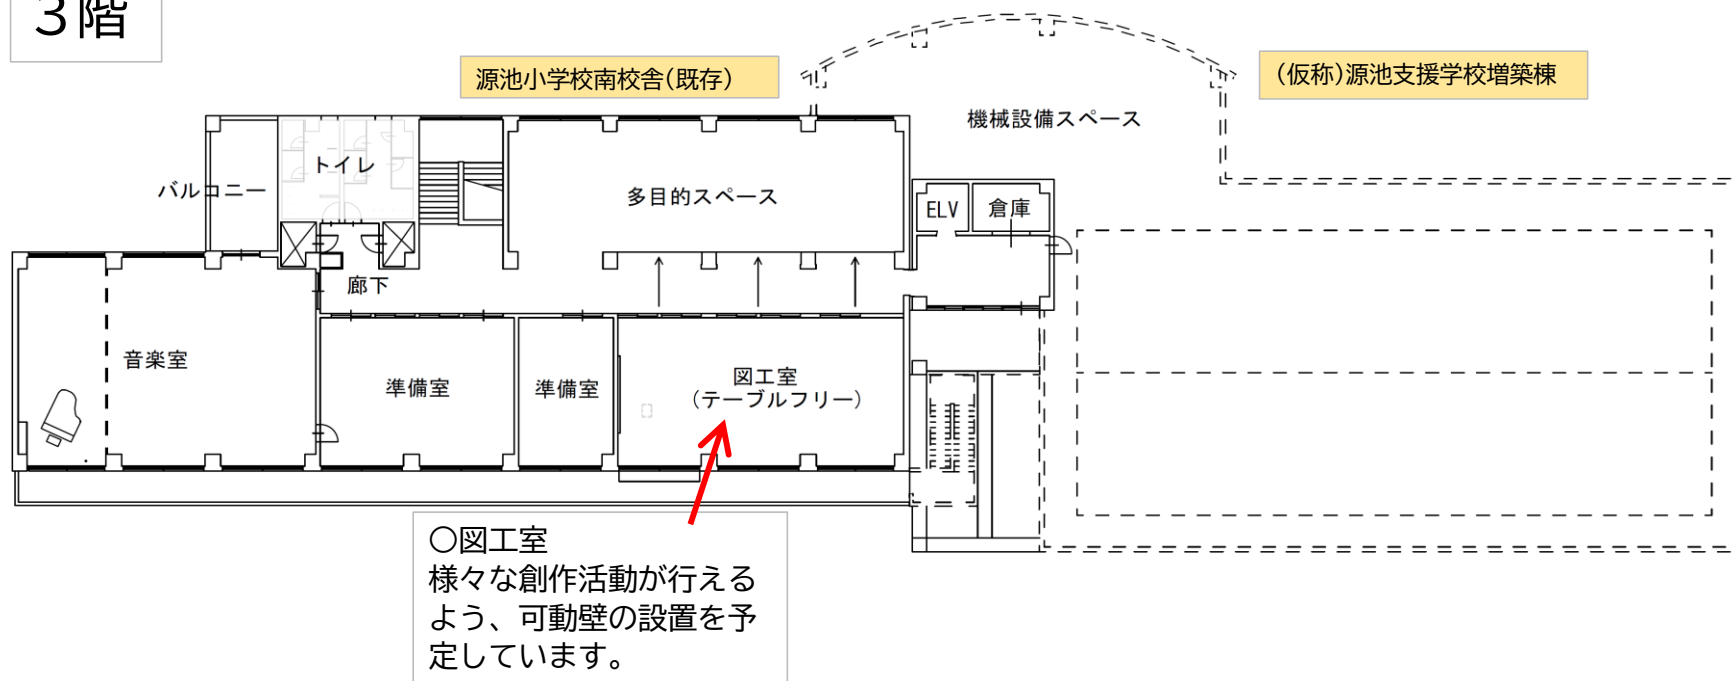


事業スケジュール

年度	令和8年度	令和9年度	令和10年度	令和11年度	令和12年度	令和13年度
月	4 7 10 1	4 7 10 1	4 7 10 1	4 7 10 1	4 7 10 1	4 7 10 1
仮設校舎		設計・建設	賃貸借期間			解体
プール		解体工事				
長寿命特支		1期工事（約16か月）	開校	2期工事（約14か月）	3期工事（約14か月）	


1 源池分教室の教室位置

寿台支援学校小学部源池分教室は、源池小学校の教室を利用して開設します。
体育館、校庭、特別教室等は源池小学校の施設を使用します。

源池小学校航空写真

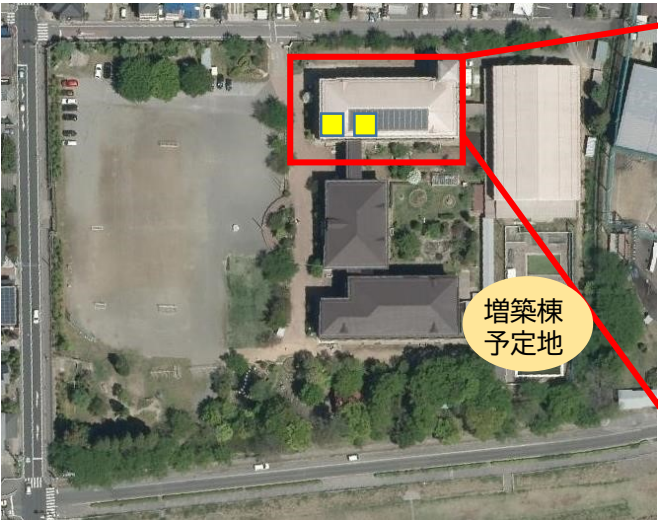

源池小学校北校舎1階配置図

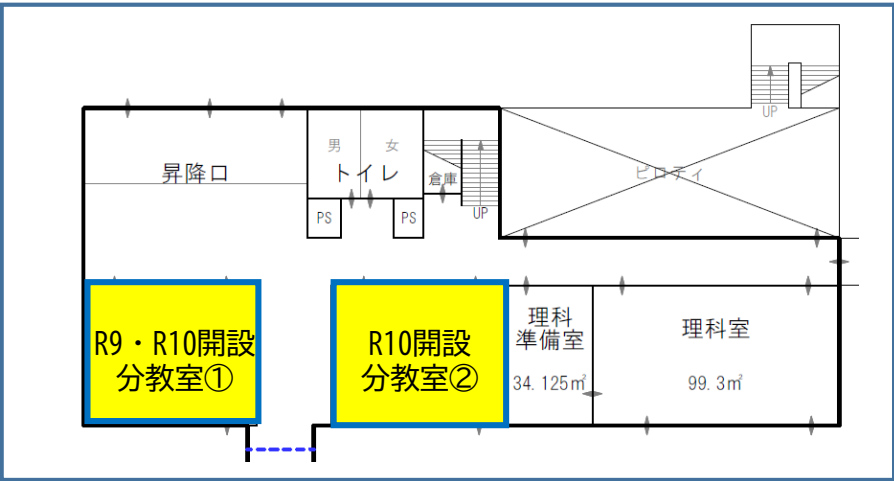

現在の教室内の様子



※ 就学判断により児童数が決まるもの。教室数は児童数に応じて、1教室又は2教室を予定

2 分教室開設に関する令和8年度中のスケジュール

	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月
	教育相談									教室環境整備・初度調弁			
2年生から分教室に通う場合 (R8年度小1)	寿台本校入学	本校通学	源池校舎見学								源池教室見学		分教室開設
新入生 (R8年度年長児)		寿台本校見学			寿台本校体験学習			就学判断		1日入学			
